

From: "Ole Jonny Mathiassen" <ole.mathiassen@egdastrek.no>
Sent: Wed, 5 Jun 2024 14:41:29 +0200
To: "Evy Ludvigsen" <evy.ludvigsen@flekkefjord.kommune.no>
Subject: Fravik fra Tek Agder bygget

Ekstern e-post:Vennligst vær varsom og ikke trykk på vedlegg og lenker med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. Hilsen DDV


Hei!

Viser til telefonsamtale. Her kommer tilleggsinfo vedr. Agderbygget og Fravik 1 vedr. isolasjon i gulv.


Som ytterligere avbøtende tiltak så vil det i tillegg til eksisterende isolasjon langs randsone mot ringmur isoleres 100 mm isolasjon på utsiden av eksisterende ringmur som anbefalt i rapport fra bygningsfysikk ansvarlig på prosjektet:

"Eksisterende ringmur er uisolert. Fundamenter og ringmurer som er plassert over frostsikker dybde anbefales frostisolert .Ringmursisolasjonen anbefales å være min. 100mm når den plasseres på en side (utsiden) av ringmuren. Isolasjonen må kapillærbrytes med fuktbestandig plate / grunnmursplate."

Under ligger detalj på oppbygning for å hindre kuldebro problemer for i nytt bygg og slippe en stor prosess med fjerning av eksisterende gulv som er en omfattende prosess både miljø og kostnadsmessig.

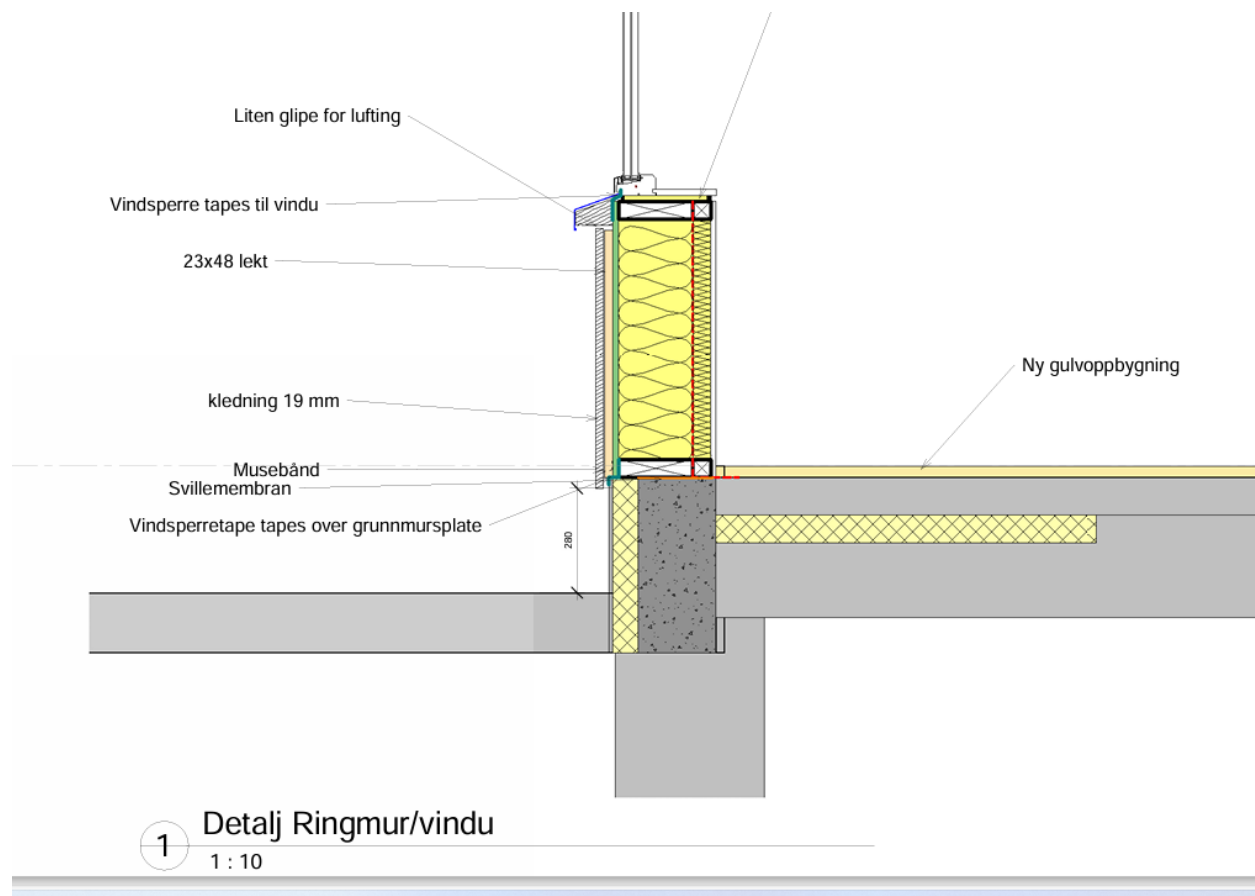

Siden også betongdekket i 2 etasje ønskes gjenbrukt så kan heller ikke gulv etterisoleres på oversiden da høyde er begrenset. Vi klarer akkurat å tilfredsstille 2,4 m ved å bruke eksisterende gulv.

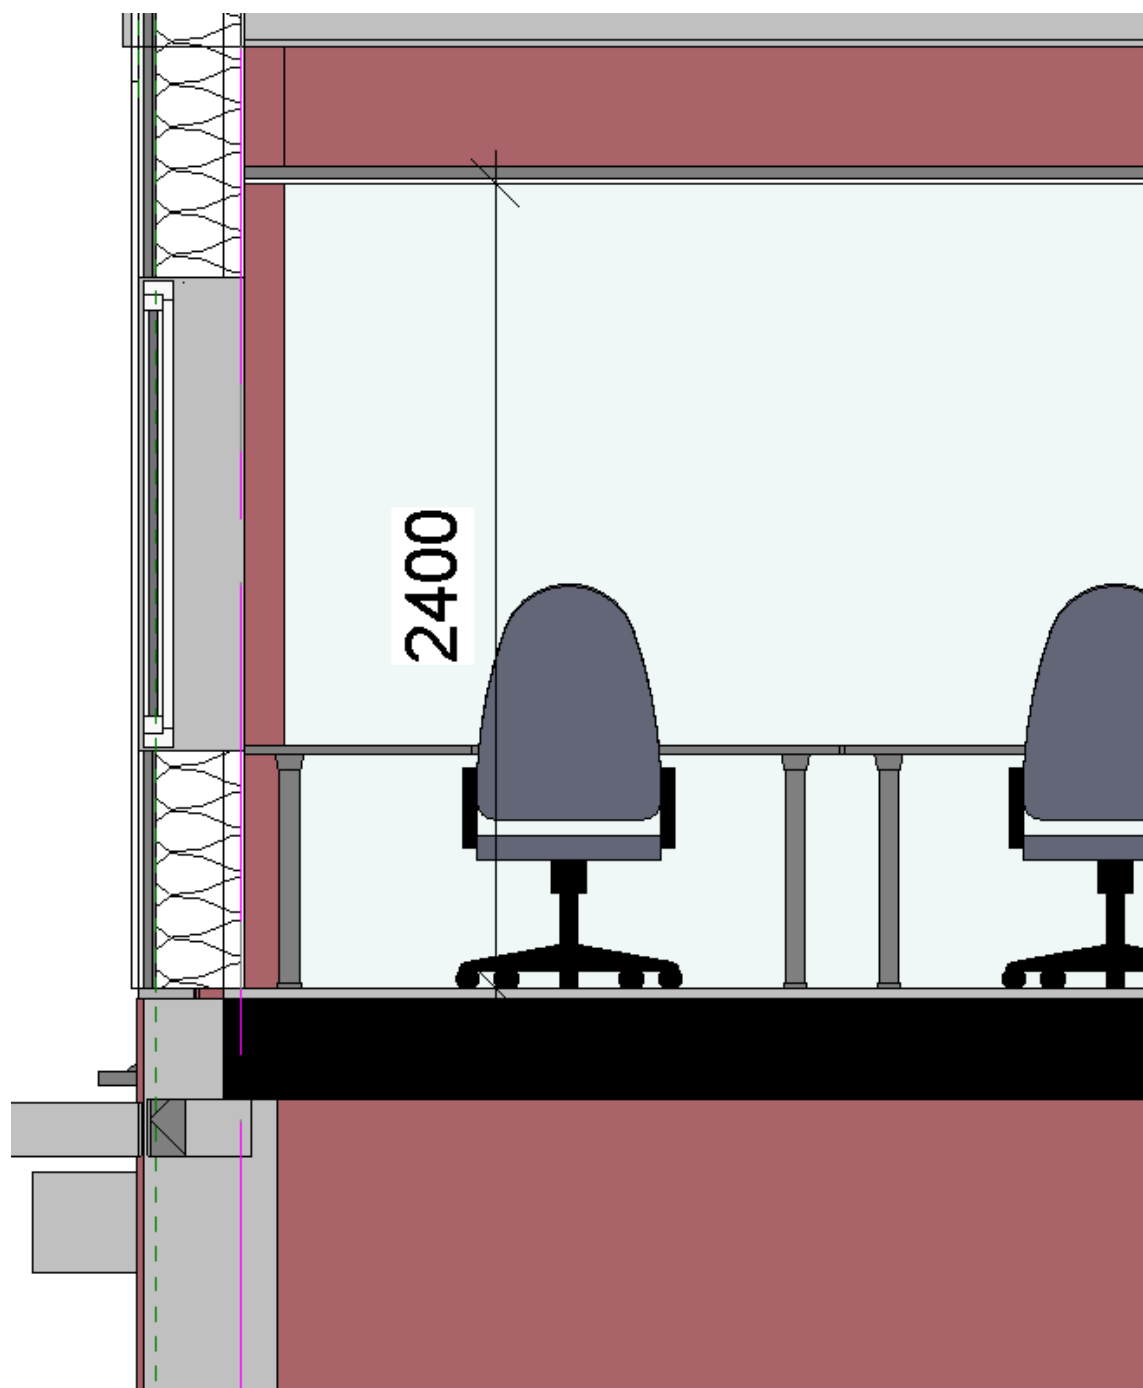

Sender over gjennomføringsplan fra systemet vårt.
Men uavhengigKontroll er signert

UTF	Montering av glasskonstruksjoner og fasadeledning	2	992604956	ØYRIG ENTREPRENØR AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐		
UTF	Plasstopte betongkonstruksjoner	2	992604956	ØYRIG ENTREPRENØR AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐		
UTF	Sanitærinstallasjoner_UTF	2	923699562	ØYRIG MODALSLEDDER AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 08.04.2024	
UTF	Slukkeinstallasjoner_UTF	2	923699562	ØYRIG MODALSLEDDER AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 08.04.2024	
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	2	992604956	ØYRIG ENTREPRENØR AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐		
UTF	Varme og kuldeinstallasjoner	2	923699562	ØYRIG MODALSLEDDER AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 08.04.2024	
UTF	Veg- og grunnarbeider	2	827439762	ØYRIG KVINA MASKIN AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 19.04.2024	
UTF	Ventilasjon og klimainstallasjoner	2	937775741	ØYRIG AERON AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 08.04.2024	
KONTROLL	Brannsjikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)	2	998805449	ØYRIG Tomstad AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 06.05.2024	
KONTROLL	Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)	2	920312764	ØYRIG VIKESÅ BYGGPROSJEKTERING AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 06.05.2024	
KONTROLL	Konstruksjonssjikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)	2	920312764	ØYRIG VIKESÅ BYGGPROSJEKTERING AS	☐	☐	☐	☐	☒		☐	Signert 06.05.2024	



Med vennlig hilsen
Ole Jonny Mathiassen
Ingeniør

913 55 910
www.egdastrek.no
