


Prosjektstruktur

Det er enighet mellom styret i Stiftelsen Setesdal stavkyrkje, administrativ ledelse ved Stiftelsen Lillehammer museum og Norsk håndverksinstitutt om følgende modell for prosjektstruktur;

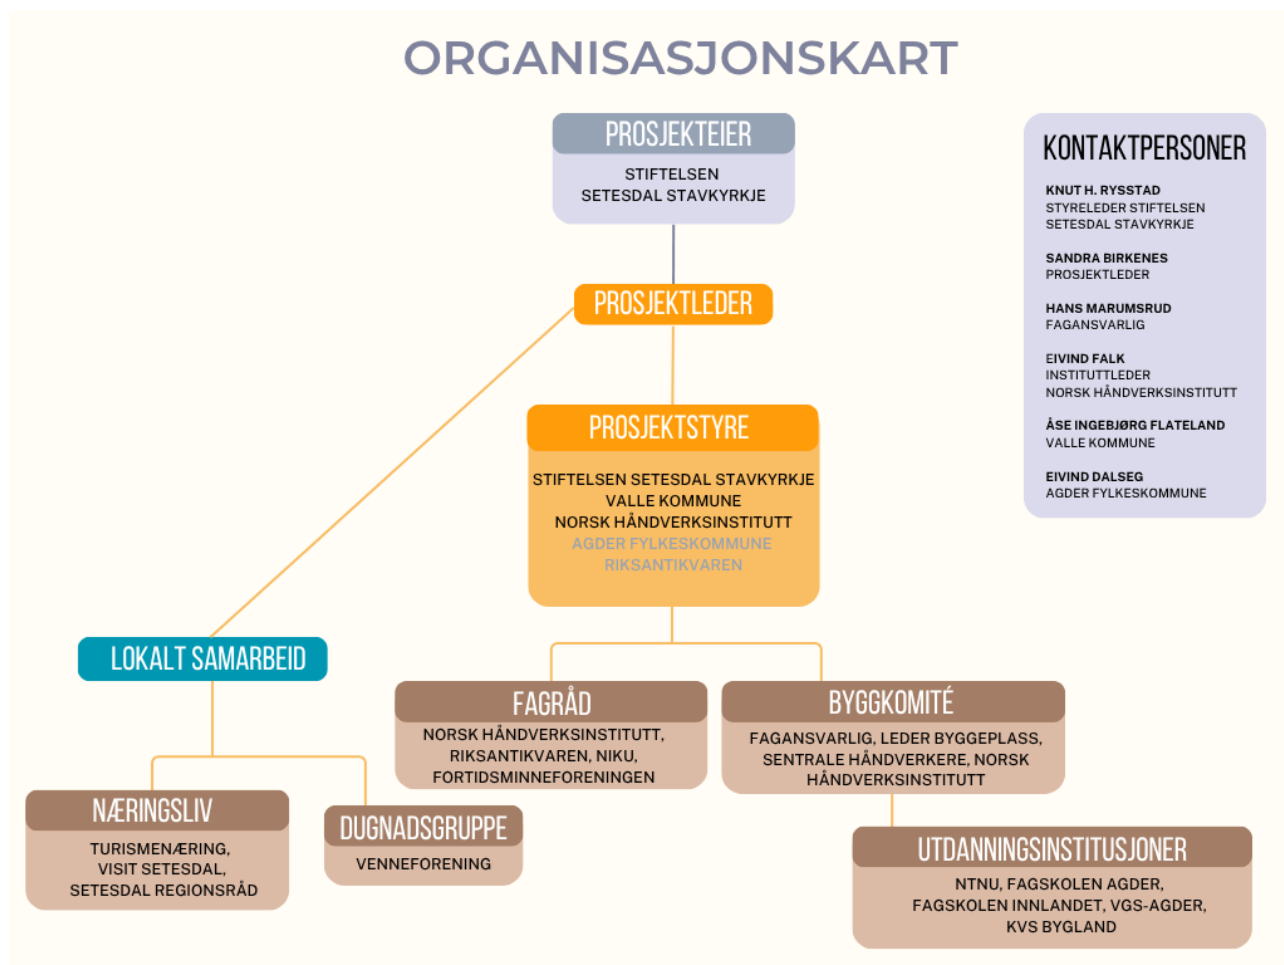

Stiftelsen Setesdal stavkyrkje er prosjekteier og byggherre og har ansvar for økonomisk og administrativ styring, inkludert personalansvar, ansvar for HMS og likviditet. Prosjektleder er ansatt i stiftelsen og har stiftelsesstyret som sin arbeidsgiver.

Norsk håndverksinstitutt er ansvarlig for det faglige knyttet til den prosessuelt autentiske rekonstruksjonene, herunder ledelse av fagråd og tilrettelegging av læringsarenaer og forsknings- og kunnskapsutviklingsarbeid.

Prosjektstyre

Det etableres et prosjektstyre for prosjektet. Stiftelsen Setesdal stavkyrkje og Norsk håndverksinstitutt sitter i prosjektstyret med én representant hver, sammen med representant fra Valle kommune. Agder fylkeskommune er invitert inn med én representant (invitasjonen er pr. 11.08.25 ubesvart). Det er ønskelig med en ekstern representant fra Riksantikvaren. Prosjektstyret skal ha ansvar for koordinering av prosjektet, økonomisk, faglig og administrativt. Prosjektstyret vil fungere som et samarbeidsorgan mellom involverte aktører, med den hensikt å ivareta en god fremdrift og kommunikasjon i et stort og omfattende prosjekt.

Fagråd

Norsk håndverksinstitutt har ansvaret for etableringen av et fagråd som skal ha ansvar for faglig innhold knyttet til den prosessuelt autentiske rekonstruksjonene av Borgund stavkirke, herunder prosjektets rolle som opplæringsarena for nye tradisjonshåndverkere, samt ansvar for forskning og kunnskapsutvikling knyttet til prosjektet. Fagrådet skal gjøre faglige prioriteringer av midler satt av til opplæring og kunnskapsutvikling.

Byggkomité

Byggekomiteen har det overordnede ansvaret for byggeplass og prioriteringer knyttet til denne. Samarbeid mellom fagråd og byggkomité er viktig for å samordne opplærings og kunnskapsutviklingstiltak knyttet til den prosessuelt autentiske med mål om fremdrift, koordinering med tiltak som ikke omfattes av den prosessuelt autentiske rekonstruksjonen og øvrige koordineringsaktiviteter som tilligger komiteen.

Lokalt samarbeid

Det opprettes et lokalt samarbeidsfora for relevant eksisterende næringsvirksomhet, med fokus på turisme, reiseliv og besøksopplevelser. Det er ønskelig for stiftelsen å bygge opp under allerede eksisterende næring og være en samarbeidspartner i arbeidet rundt å fremme Setesdal som turistdestinasjon.

Det vil bli opprettet ei dugnadsgruppe for de som ønsker å bidra med tid inn i prosjektet. Dette vil kunne gjelde i flere ledd i prosjektet, alt etter som hvilken fase av prosjektperioden vi befinner oss i.

Det vil bli opprettet en venneforening i regi av Stiftelsen Setesdal stavkyrkje. Gjennom foreningen vil det kunne tilbys graderte medlemskap, medlemsblad, rabatterte billettpriser og tilgang på aktiviteter knyttet opp mot prosjektet.

* Både prosjektstyret og undergrupper vil kunne endre seg både i antall deltakere og samarbeidspartnere dersom det er hensiktsmessig, gitt prosjektets fremdrift og status.
